

ACTIVITY PLAN

Pengembangan Aplikasi MAP-IN Talent Management



LATAR BELAKANG & TUJUAN APLIKASI

Latar belakang

Data talenta karyawan seperti profil, riwayat karir, penilaian potensi, suksesi, dan rencana pengembangan perlu dikelola secara terpusat dan mengacu pada standar yang sama.

Aplikasi website ini menjadi wadah tunggal bagi HR dan manajemen untuk memantau dan mengembangkan talenta.

Tujuan

Membangun aplikasi website yang menyatukan profil individu, riwayat karir, talent snapshot, rencana karir, suksesi, gap kompetensi, IDP, review tahunan, dan pelatihan/sertifikasi dalam 9 tab.

Standar acuan yang dianalisis

- Katalog Kompetensi
- 16 HAV Box
- Format POTASS
- IDP 70-20-10

TIMELINE 14 AKTIVITAS

Oktober – Januari, per minggu (W1 – W4)



AKTIVITAS 1.

PENGUMPULAN DATA (Okt W1 - Okt W2)

1. Wawancara dan Pengumpulan Dokumen



Target

Minimal 3x sesi wawancara serta dokumen standar dikumpulkan dan dianalisis.

Wawancara dengan Stakeholder



Kelengkapan Dokumen



- Katalog Kompetensi
- Format POTASS
- 16 HAV Box
- IDP 70-20-10
- Dokumen Lainnya

AKTIVITAS 2 – 4.

PERANCANGAN (Okt W2 - Nov W3)

2. Penyusunan Dokumen SRS (Blue Print Website)

(Okt
W2 -
Okt
W4)



Target


1 Dokumen SRS Final Disetujui Stakeholder.

Catatan

SRS final disetujui stakeholder, arsitektur project.

3. Design Database

(Okt
W4 -
Nov
W1)

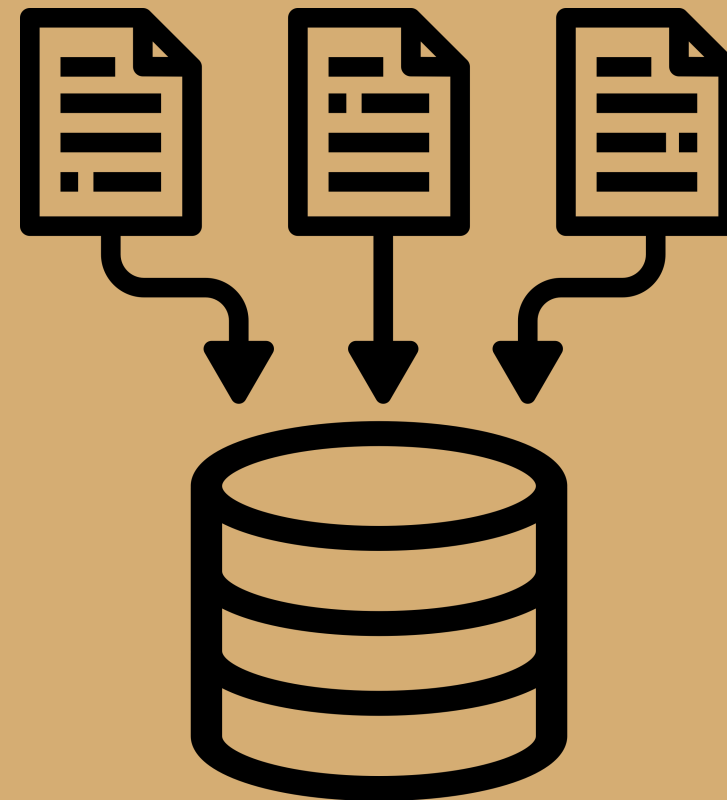

Target


Pembuatan tabel database dan diagram alur bisnis.

Catatan

Database berhasil dibuat berdasarkan SRS.

4. Perancangan Halaman Website

(Nov
W1 -
Nov
W3)

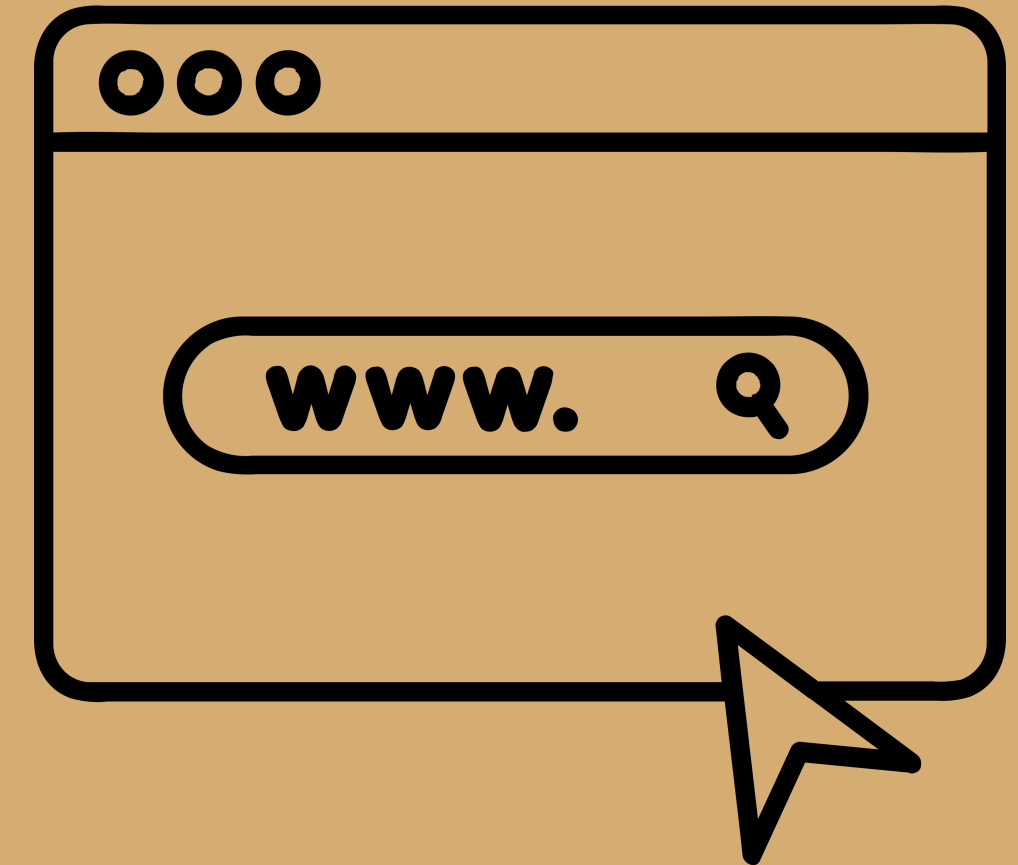

Target

Pembuatan esign awal halaman website.

Catatan

Pembuatan desain wireframe awal berdasarkan SRS.

AKTIVITAS 5 – 8.

DEVELOPMENT 4 TAHAP (Nov W3 - Jan W1)

5. Development Tahap 1

(Nov W3 - Des W3)

- Hal 1: Profil Individu lengkap
- Hal 2: Riwayat Karir
- Hal 3: Talent Snapshot

Catatan

Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman

6. Development Tahap 2

(Nov W3 - Des W4)

- Hal 4: Individual Career Plan
- Hal 5: •Status Suksesi
- Hal 6: Analisis Gap Kompetensi

Catatan

Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman

7. Development Tahap 3

(Nov W3 - Des W4)

- Hal 7: •Individual Development Plan
- Hal 8: •Review Tahunan
- Hal 9: Pelatihan / Sertifikasi

Catatan

Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman

8. Development Tahap 4

(Nov W3 - Jan W1)

- Fitur Tambahan (Jika ada)

Catatan

Menyelesaikan Fitur Tambahan Jika ada dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman

AKTIVITAS 9 –11. TEST, IMPLEMENTASI & MONITORING (Des W4 - Jan W4)

9. Test Aplikasi (Des W4 - Jan W2)

Target

Pengujian Sistem Aplikasi

Catatan

Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.

10. Implementasi Di Localhost (Jan W1 - Jan W3)

Target

Pengujian sistem aplikasi di localhost

Catatan

Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.

11. Monitoring Aplikasi (Jan W2 - Jan W4)

Target

Perbaiki jika ditemukan kesalahan/bug pada aplikasi website

Catatan

Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.

AKTIVITAS 12 – 14. DEPLOYMENT

SAMPAI SIAP DIGUNAKAN (Jan W3 - Jan W4)

12. Deployment (Siap digunakan)

(Jan W3 - Jan W4)

Target

Aplikasi dapat digunakan secara umum

Catatan

Melakukan Deployment bersama tim.

13. Dokumentasi Penggunaan Website

(Jan W3 - Jan W4)

Target

Membuat panduan untuk penggunaan website

Catatan

Membuat dokumentasi untuk penggunaan website.

14. Proyek Website Siap Digunakan

(Jan W3 - Jan W4)

Target


Sesi training pengguna selesai

Catatan

Membuat dokumentasi untuk penggunaan website.

BEBAN KERJA MEMUNCAK DI NOV W3 - DES W4

Jumlah aktivitas (dari 14) yang berjalan bersamaan tiap minggu

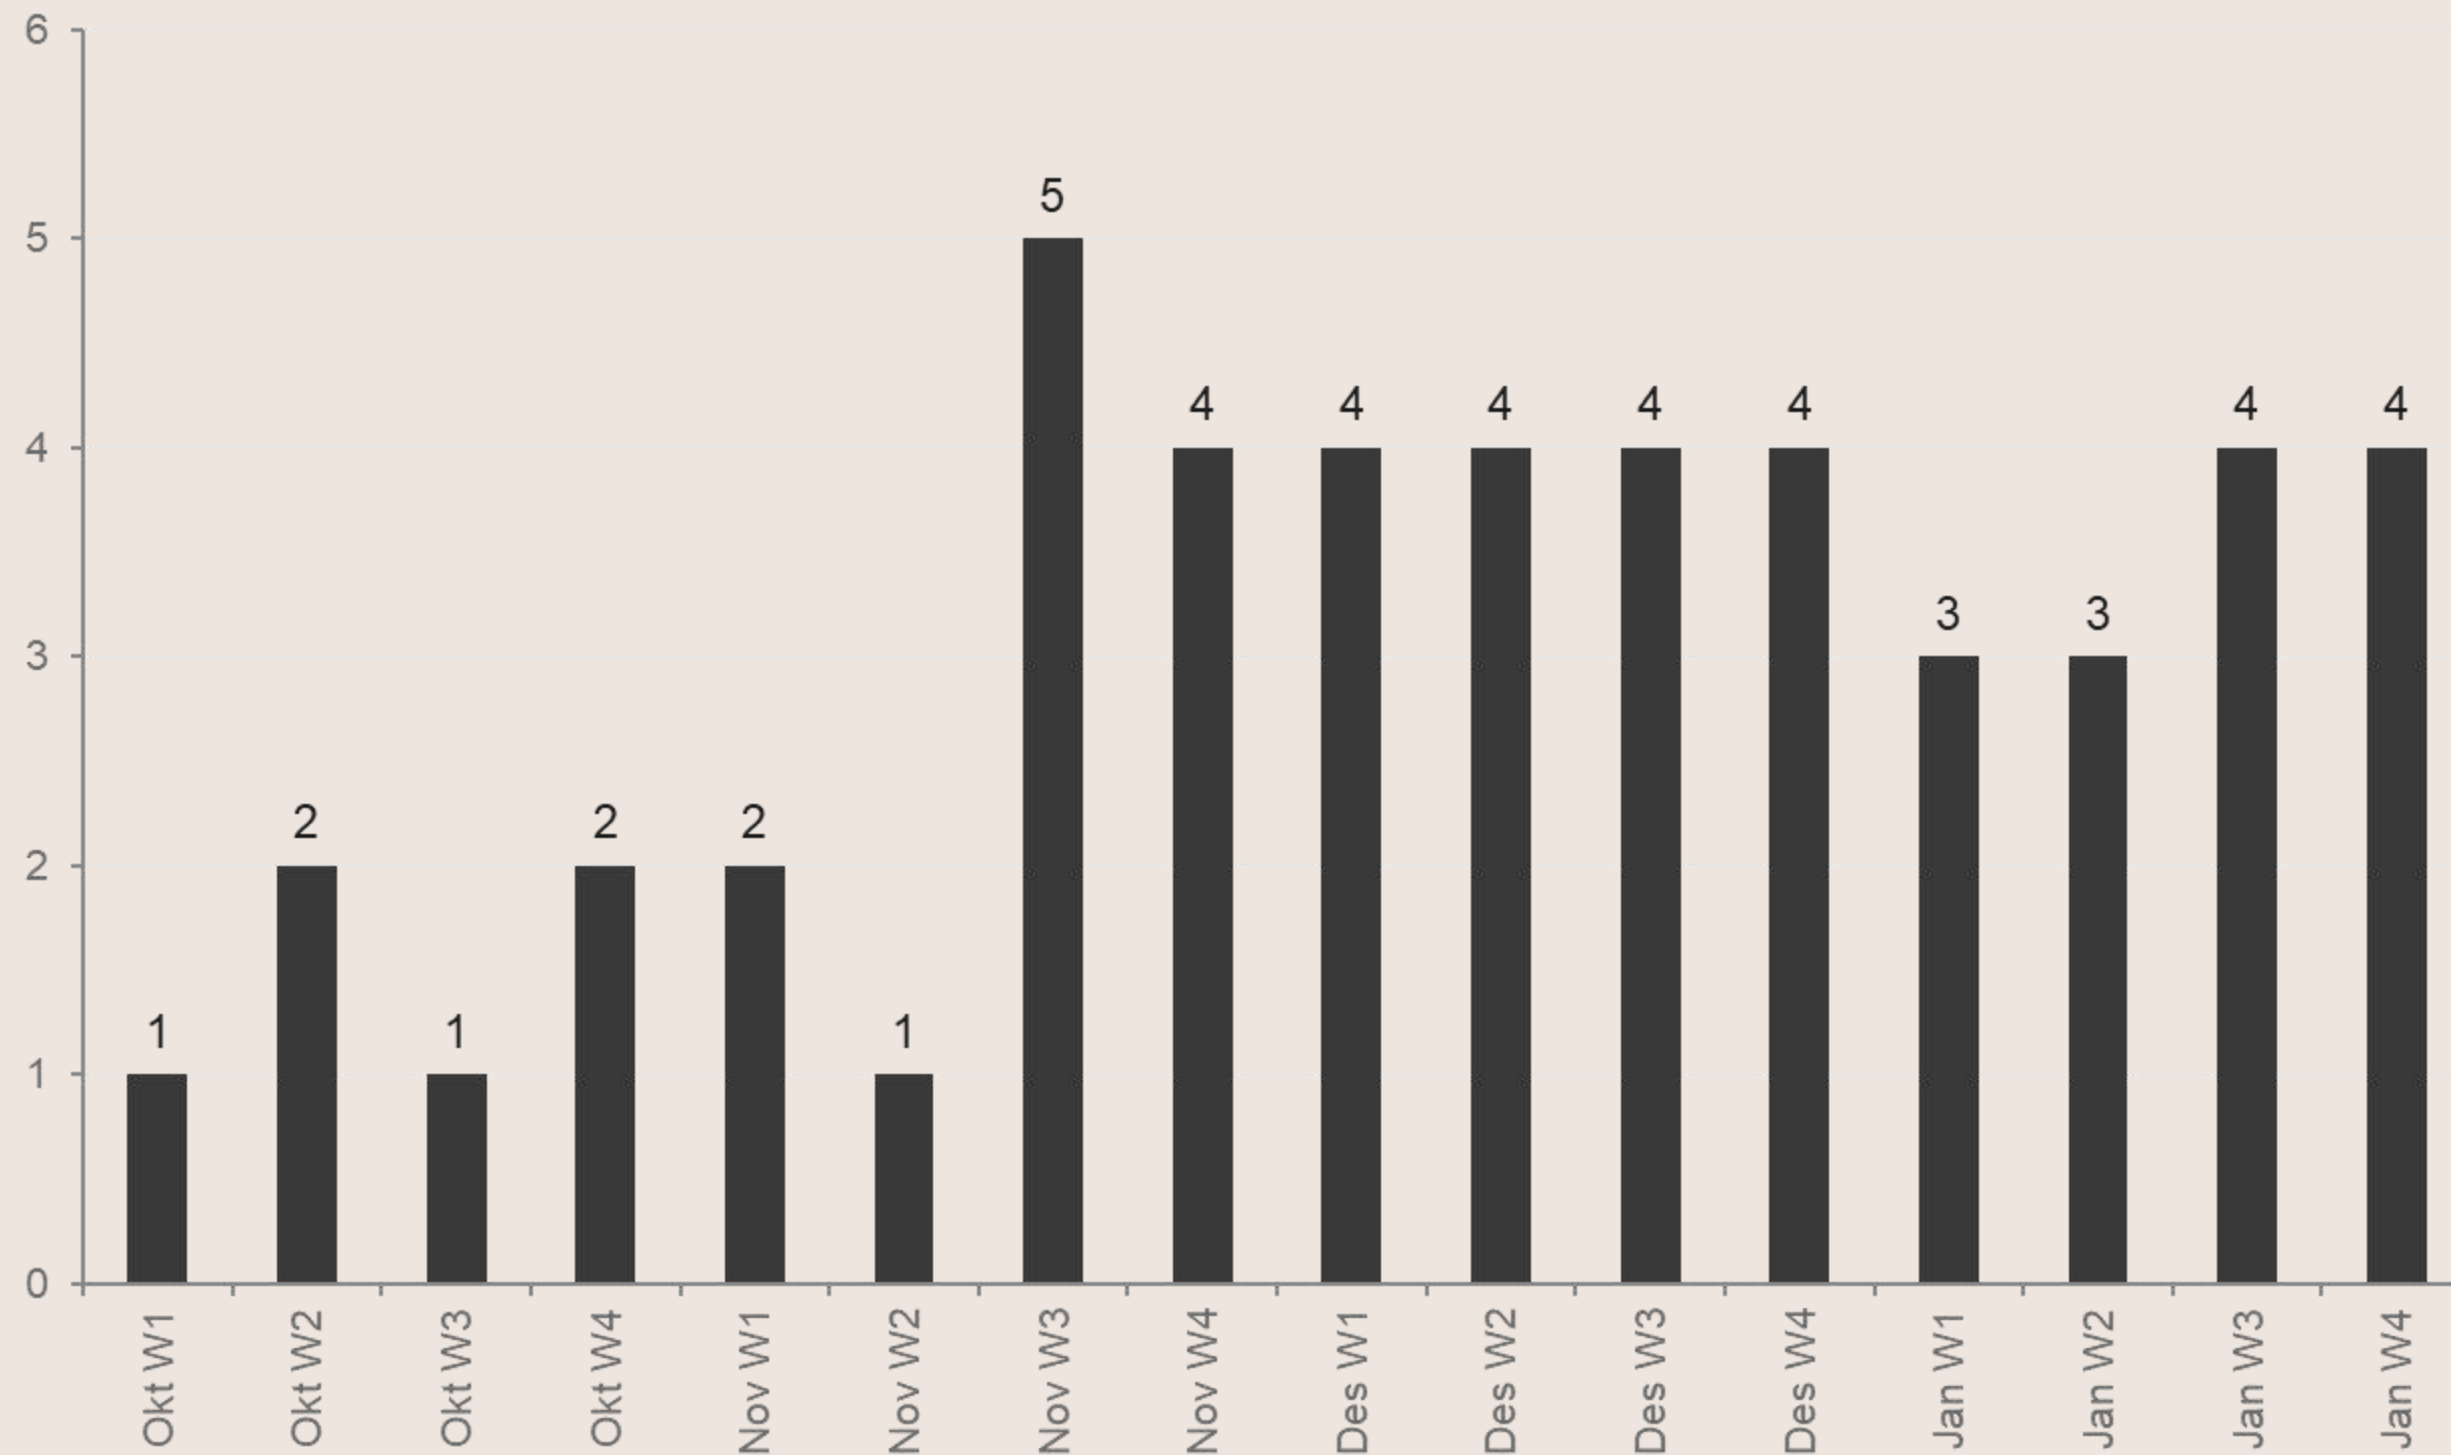

**5 aktivitas paralel
di Nov W3, saat 4
tahap development
dimulai**

Dari Nov W3 hingga Des W4 selalu ada minimal 4 aktivitas berjalan bersamaan, sehingga koordinasi tim dan pembagian tugas perlu dijaga.

MONITORING PROGRES:

PLAN VS ACTUAL (Baris Actual pada Excel diisi berkala untuk membandingkan rencana dengan realisasi)

1 PLAN

Jadwal rencana tiap aktivitas (sel biru di Excel)

2 ACTUAL

Realisasi diisi berkala di baris Actual

3 REVIEW

Bandingkan deviasi saat pertemuan rutin (Selisih antara plan dan actual)

4 Tindak lanjut

Atur ulang prioritas bila ada keterlambatan

Titik kritis yang dipantau

- SRS harus disetujui stakeholder sebelum tahap perancangan dan development berjalan
- Nov W3 – Des W4: minimal 4 aktivitas berjalan paralel
- Januari: test, localhost, monitoring, deployment, dan dokumentasi bertumpuk

KESIMPULAN

- Menyelesaikan 14 aktivitas dalam 16 minggu (Oktober–Januari), mencakup keseluruhan proses mulai dari pengumpulan data hingga training.
- Berhasil mengembangkan 9 tab modul melalui 4 tahap development, dilengkapi fitur login, register, dan search.
- Website siap digunakan, telah melalui tahap deployment, dokumentasi, dan sesi training pengguna.
- Proyek berjalan sesuai timeline dan target yang direncanakan sejak tahap awal.
